別記様式第1号 別添 脱炭素先行地域 進捗状況報告票

提案者名:	梼原	訂町	_	
(共同提案	者:_)
対象年度:	令和_	4	_年度	

<総論>

1. 民生部門の電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロの実現について

令和4年度は、事業スケジュールに沿って事業を行うことができたが、事業内容(一体不可分と考えていた発電所建屋や敷地造成設計)が交付金対象外となったこともあり、事業費調達に苦慮した。

このことから令和5年度以降は、事業について業者と契約したら、その内訳書を環境省で確認してもらい、どれが交付対象なのか確認してもらうようにしている。結果、町の負担(単独費)が増えるようなら、令和5年度は、起債で対応しようと考えているが、令和6年度以降は、事業が工事となり、事業費大きくなるため、現時点ではどのように対応できるか不透明である。

2.	計画の変更箇所について
4.	山凹ツ及又凹川について

- ① 木質バイオマス発電に必要な木質ペレット製造工場の増設事業
- ② 自営線に接続する施設の追加
- ③ EV 車1台の前倒し購入

3. 計画の変更可能性、今後の展開について

令和5年度に木質バイオマス発電や自営線、蓄電池、充放電設備、急速充電設備等のマイクログリッド事業の設計を行う予定だが、交付決定等の時期によって繰越となる可能性がある。

4. その他 (評価委員会からの講評への対応状況等)

令和4年度は、地域新電力会社の設立に向け、以前から行っている事業体制、電力調達方法、収支シミュレーション等の時点修正やスケジュールの精査を行った。

現在、新電力会社は株式会社(町出資 100%)とする方向で定款等の精査を行っている。設立後は、事業ライセンスの取得手続きを行い、年度末に公共施設を対象に小売事業を開始する行程で進めている。

- ・組織体制(町出資100%で会社を設立予定)
- ・関係者との調整状況(町出資 100%で会社設立予定だが、現在、関係事業者に取締役への就任の依頼を行っている。)


<事業費>

(単位:千円)


	精算払・概算払	計画対象年度	前年度(注
地方公共団体の自主財源		11,141	
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払 概算払	3,819	
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計		14,960	

- 注) 前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

<エリア図と進捗状況>

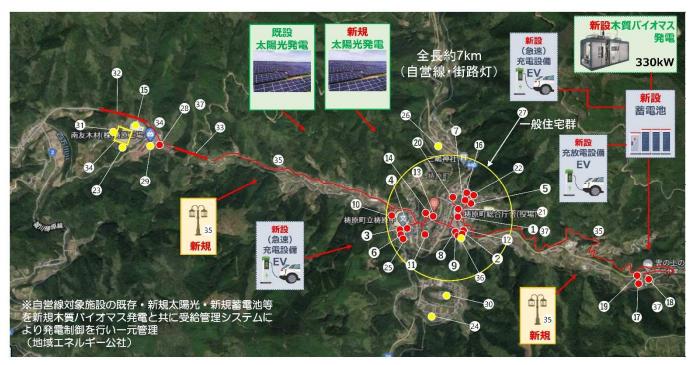

론質ゼロ」の達成率】 再エネ等の電力供給量 (A)		省エネによる電力削減量 (B)		
(0%)		(0%)		
0	+	0	÷	-
(kWh/年)		(kWh/年)		




							再エネ	等の供給量(kV	Wh/年)		再エネ等の	省エネによる	CO2	
No.	種類	民生部門の	件数	合意形成の	電力需要量		内訳			電力供給元	電力削減量	排出削減量	実施取組	
110.	主人只	電力需要家	状況	状況	(kWh/年)	合計	自家消費等	相対契約	再エネ メニュー	証書	(発電主体)	(kWh/年)	(t-CO2)	人加巴利利
1)	公共	·庁舎等 梼原町総合 庁舎、原町 消防屯所 (防災拠点 施設))	2	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	327,039	0	0							【再エネ】
2	公共	・学校 梼原中学 校、梼原小 学校、梅原小 学校、梅原 ではも関、 梼原 では、 大は、 大は、 大は、 大は、 大は、 大は、 大は、 大	4	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	278,344	0	0							【再エネ】
3	公共	・文化施設 雲の上の地と 書がまた。 では、センは では、一点を では、 では、 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。	6	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	285,215	0	0							【街エネ】

		構造改善セ ンター(和 田城)、ゆ すはら座									
4	公共	・医療・福 祉施設 梼原病院 (保健福祉 支援センタ ー)	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	365,095	0	0				【街エネ】
(5)	公共 (民生·業務)	・医療・福 祉施設 梼原歯科診 療所、複合 福祉施設	2	□合意済み□一部合意■一部説明□未説明	199,140	0	0				【再エネ】
6	民生・業務	・医療・福 祉施設 カルスト会 (障害者支 援、老人ホ ーム)	1	□合意済み □一部合意 □一部説明 ■未説明	794,425	0		0			【再エネ】
7	公共 (民生·業務)	・雲泉の雲ーシらル店草(利法ののルのマすテ売旧所非ゆは、プルは、東京上、ゆまか、育定人東には、アルは、東京には、アルは、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東、東	5	□合意済み □一部合意 ■一部説明 □未説明	856,843	0	0				【省エネ】
8	公共	・体育館 梼原体育館	1	■合意済み □一部合意	15,280	0	0				【再エネ】【省エネ】

				□一部説明 □未説明							
9	公共	・体育館梼原町健康推進センター (大越体育館)	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	18,381	0		0			【再エネ】
(1)	公共	・汚水処理施設梼原浄化センター	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	266,813	0		0			【再エネ】
(1)	公共	・住宅 梼原中学校 (南寮舎) ゆすのき寮	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	68,393	0	0				【再エネ】
12	公共	・住宅 生涯学習交 流センター (梼原高校 の寮)	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	141,098	0		0			【再エネ】
(3)	民生・家庭	・住宅 一般住宅 (27 戸)	1	□合意済み □一部合意 □一部説明 ■未説明	151,284	0		0			【再エネ】
(4)	公共	・電灯 藤の越トン ネル、維新 トンネル、 脱藩の道街 路灯(新設 330 基))	3	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	67,062	0	0				【再エネ】
(5)	公共	・電灯 梼原町農村 広場(大越 グランド)	1	■合意済み □一部合意 □一部説明 □未説明	7,344	0		0			【再エネ】

				■合意済み								【再エネ】
16	公共	梼原光ネッ トセンター	1	□一部合意□一部説明□未説明	35,549	0		0				【省エネ】
												【再エネ】
												【省エネ】
				合計	(C) 3, 868, 306	(A)	0	0		_	(B)	



- ① 【施設管理者=公共施設、需要家=公共】合意済み
- ② 【施設管理者=公共施設、需要家=民間】施設管理者=合意済み、需要家=一部説明
- ③ 【施設管理者=民間、需要家=民間】未説明
- ・需要家の多くは公共施設であるので、合意済み。民間需要家の一部とは合意ができているが、令和5年度に地域新電力会社を設立した後、民間需要家との合意形成を令和6年度に図っていく。

<民生部門の電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロの実現について>

【再エネに係るもの】

○取組①:木質バイオマス発電の導入

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
		工程	基本設計等	設計	工事	運営	運営	運営	運営	運営	運営
計画	目標	(単年度) 出力 (kW)	0	0	330	0	0	0	0	0	0
	値	(累計) 出力 (kW)	0	0	330	330	330	330	330	330	330
		工程	基本設計等								
状況	実	(単年度) 出力 (kW)	0								
	績	(累計) 出力 (kW)	0								

(説明)

令和4年度は、木質バイオマス発電の基本設計や造成設計を行った。令和5年度は詳細設計に着手する 予定。令和6年度に工事を行い、令和7年度から稼働・運転を行っていく計画である。

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度(注
地方公共団体の自主財源		11,141	
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払	3,819	
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計		14,960	

- 注)前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

○取組②:太陽光発電の導入

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
		工程				設計	設計工事	工事	運営	運営	運営
計画	目標	(単年度) 出力 (kW)	0	0	0	0	80	90	0	0	0
	値	(累計) 出力 (kW)	0	0	0	0	80	170	170	170	170
		工程									
状況	実	(単年度) 出力 (kW)	0								
	績	(累計) 出力 (kW)	0								

(説明)

令和 4 年度は、未着手。令和 5 年度も他の取り組みを優先して行うこととしていることから未着手の予 定。

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度 ^{(注}
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注)前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

【省エネに係るもの】

○取組 : 無し

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
	工程										
計画	目	(単年度)									
	標値	(累計)									
		工程									
状況	実	(単年度)									
	績	(累計)									

(説明)

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度 ^{(注}
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注) 前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

<民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組>

○取組①:太陽光発電の導入

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
	工程					設計	工事	運営	運営	運営	運営
	目標	(単年度) 出力 (kW) 削減量 (t-co2)	0	0	0	0	20 14.6	0	0	0	0
	値	(累計) 出力 (kW) 削減量 (t-co2)	0	0	0	0	20 14.6	20 14.6	20 14.6	20 14.6	20 14.6
		工程									
	実	(単年度) 出力 (kW)	0								
	績	(累計) 出力 (kW)	0								

(説明)

令和4年度は未着手。令和5年度も他の取り組みを優先して行うこととしていることから未着手の予定。

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度(注
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注)前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

○取組②:木質バイオマスによる排熱供給(熱電併給)

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
	工程		基本設計等	設計	工事	運営	運営	運営	運営	運営	運営
計画	目標	(単年度) 削減量 (t-co2)	0	0	315.3	0	0	0	0	0	0
	値	(累計) 削減量 (t-co2)	0	0	315.3	315.3	315.3	315.3	315.3	315.3	315.3
		工程	基本設計等								
状況実		(単年度) 削減量 (t-co2)	0								
	績	(累計) 削減量 (t-co2)	0								

(説明)

令和4年度は、木質バイオマス発電(熱電併給)の基本設計や造成設計を行った。令和5年度は詳細設計 に着手する予定。令和6年度に工事を行い、令和7年度から稼働・運転を行っていく計画である。

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度 ^{(注}
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注)前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

○取組③④:相対契約、再エネメニュー

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
計画		工程	検討	設立	運営						
	目標	(単年度) 電力量 (kWh) 削減量 (t-co2)	0	0	1248.576 686.7	0	0	0	0	0	0
	値	(累計) 電力量 (kWh) 削減量 (t-co2)	0	0	1248.576 686.7						
		工程	検討								
状況	実	(単年度) 電力量 (kWh) 削減量 (t-co2)	0								
	績	(累計) 電力量 (kWh) 削減量 (t-co2)	0								

(説明)

令和4年度は、地域新電力会社の設立に向け、以前から行っている事業体制、電力調達方法、収支シミュレーション等の時点修正やスケジュールの精査を行った。令和5年度に地域新電力会社を設立し、令和6年度から需要家に再エネ電力を供給していく予定である。

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度(注
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注)前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。 ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。
- ○取組⑤:モビリティの EV 化

			令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
	工程				導入 (EV-F 1台)	導入 (EV 5台)	導入 (EV 8台)	運用	運用	運用	運用
計画	目標	(単年度) 削減量 (t-co2)	0	0	2.6	6.1	5.8	0	0	0	0
	値	(累計) 削減量 (t-co2)	0	0	2.6	8.7	14.5	0	0	0	0
		工程									
状 況	実	(単年度) 削減量 (t-co2)	0								
	績	(累計) 削減量 (t-co2)	0								

(説明)

・当初計画 (R7,8 年度) から前倒しで、令和 5 年度に再エネ交付金を活用し、1 台導入を検討していたが、再エネ交付金を利用せずに単独で起債を借りたほうが有利になることから、先行地域の事業計画としては実施していく予定だが、再エネ交付金を活用しない方向で考えている。

(事業費) (単位:千円)

	精算払・概算払	計画対象年度	前年度 ^{(注}
地方公共団体の自主財源			
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	精算払・概算払		
その他交付金等	精算払・概算払		
()			
民間等による資金			
合 計			

- 注) 前年度、交付金を概算払の金額で報告していた場合、精算後の事業費を改めて記載してください。
- ※ その他交付金等について、必要に応じて行を追加してください。

<KPI>

○指標①-1:環境保全効果-植栽面積(波及効果)

		令和 4	令和 5	令和6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
	(単年度) 面積 (ha)	5	10	10	10	10	10	10	10	10
目標値	(累計) 面積 (ha)	5	15	25	35	45	55	65	75	85
実績	(単年度) 面積 (ha) (累計) 面積 (ha)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標①-2:環境保全効果-間伐面積(波及効果)

		令和4	令和 5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
口捶店	(単年度) 面積 (ha)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
目標値	(累計) 面積 (ha)	50	100	150	200	250	300	350	400	450
実績	(単年度) 面積 (ha) (累計) 面積 (ha)									

(説明)

○指標①-3:環境保全効果-FSC 森林認証面積(波及効果)

		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
	()). (平及	中皮	平皮	平皮	平皮	平戊	平皮	平皮	平茂
	(単年度)									
	面積	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0
目標値	(ha)									
口你胆	(累計)									
	面積	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
	(ha)									
	(単年度)									
	面積									
力体	(ha)									
実績	(累計)									
	面積									
	(ha)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標①-4:環境保全効果-環境先進企業との協働の森林づくり協定数(波及効果)

		令和 4	令和 5	令和6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
	(単年度) 企業数	5	0	0	0	0	0	0	0	0
目標値	(累計) 企業数	5	5	5	5	5	5	5	5	5
/tz 6=	(単年度) 企業数									
実績	(累計) 企業数									

(説明)

○指標②-1:地域経済効果-搬出木材材積

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
口無病	(単年度) 材積 (m3)	4,400	4,400	4,400	4,400	6,600	6,600	7,700	7,700	8,800
目標値	(累計) 材積 (m3)	4,400	8,800	13,200	17,600	24,200	30,800	38,500	46,200	55,000
実績	(単年度) 材積 (m3) (累計) 材積 (m3)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標②-2:地域経済効果-木質ペレット工場持込端材量

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
口無法	(単年度) 端材量 (t)	3,920	3,920	3,920	3,920	6,670	6,670	8,700	8,700	8,700
目標値	(累計) 端材量 (t)	3,920	7,840	11,760	15,680	22,350	29,020	37,720	46,420	55,120
実績	(単年度) 端材量 (t) (累計) 端材量 (t)									

(説明)

○指標②-3:地域経済効果-木質ペレットの販売量

		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
口無法	(単年度) 販売量 (t)	1,400	1,400	1,400	1,400	2,300	2,300	2,900	2,900	2,900
目標値	(累計) 販売量 (t)	1,400	2,800	4,200	5,600	7,900	10,200	13,100	16,000	18,900
実績	(単年度) 販売量 (t) (累計) 販売量 (t)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標②-4:木質バイオマス発電所の発電量

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
日無店	(単年度) 発電量 (MWh)	0	0	0	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475
目標値	(累計) 発電量 (MWh)	0	0	0	2,475	4,950	7,425	9,900	12,375	14,850
470年	(単年度) 発電量 (MWh)	0								
実績	(累計) 発電量 (MWh)	0								

(説明)

令和4年度は、木質バイオマス発電(熱電併給)の基本設計や造成設計を行った。令和5年度は詳細設計に着手する予定。令和6年度に工事を行い、令和7年度から稼働・運転を行っていく計画であるため、実績が上がるのは令和7年度からの予定である。

○指標②-5:地域経済効果-地域エネルギー公社の再エネ電気販売量

		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
口無法	(単年度) 電気販売量 (MWh)	0	0	0	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106
目標値	(累計) 電気販売量 (MWh)	0	0	0	3,106	6,212	9,318	12,424	15,530	18,636
実績	(単年度) 電気販売量 (MWh)	0								
天碩	(累計) 電気販売量 (MWh)	0								

(説明)

令和 4 年度は、地域新電力会社の設立に向け、以前から行っている事業体制、電力調達方法、収支シミュレーション等の時点修正やスケジュールの精査を行った。計画では令和 7 年度からの電気販売であるが、令和 5 年度に地域新電力会社を設立し、令和 6 年度から需要家に再エネ電力を供給していく方向で進めている。

○指標②-6:雲の上の施設群の利用者数(波及効果)

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
口無法	(単年度) 利用者数 (人)	50,000	50,000	50,000	50,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000
目標値	(累計) 利用者数 (人)	50,000	100,000	150,000	200,000	270,000	350,000	440,000	540,000	650,000
実績	(単年度) 利用者数 (人) (累計) 利用者数 (人)									

(説明)

○指標②-7:地域経済効果-起業者数(波及効果)

		令和 4	令和 5	令和6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
目標値	(単年度) 起業件数 (件)	1	2	2	2	2	3	3	3	3
日际但	(累計) 起業件数 (件)	1	3	5	7	9	12	15	18	21
実績	(単年度) 起業件数 (件) (累計) 起業件数 (件)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標③-1:地域防災効果-一般家庭への太陽光発電・蓄電池の導入件数(波及効果)

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度						
口無病	(単年度) 導入件数 (件)	2	2	2	2	2	2	2	3	3
目標値	(累計) 導入件数 (件)	2	4	6	8	10	12	14	17	20
実績	(単年度) 導入件数 (件) (累計) 導入件数 (件)									

(説明)

○指標③-2:地域防災効果-EV 等再エネ設備を活用した防災訓練

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度						
口無法	(単年度) 回数 (回)	1	1	1	1	1	1	2	2	2
目標値	(累計) 回数 (回)	1	2	3	4	5	6	8	10	12
実績	(単年度) 回数 (回) (累計) 回数 (回)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標④-1:暮らしの質の向上-一般家庭への新エネルギー設備の導入件数(波及効果)

		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
目標値	(単年度) 導入件数 (件数)	10	10	10	20	20	20	20	20	20
	(累計) 導入件数 (件数)	10	20	30	50	70	90	110	130	150
実績	(単年度) 導入件数 (件数) (累計) 導入件数 (件数)									

(説明)

○指標④-2:暮らしの質の向上-町内への EV の普及 (波及効果)

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度						
目標値	(単年度) 導入台数 (台)	0	0	0	0	5	8	2	2	3
	(累計) 導入台数 (台)	0	0	0	0	5	13	15	17	20
実績	(単年度) 導入台数 (台) (累計) 導入台数 (台)									

(説明)

当年度(令和4年度)の各 KPI の達成状況(数量等実績)は、各担当部局で集計を行っており、翌年度(令和5年度)の10月(議会決算報告時)に出揃うことから、その時点での計上となる。

○指標④-3:暮らしの質の向上-児童生徒への環境教育・学習

		令和 4	令和 5	令和 6	令和 7	令和 8	令和 9	令和 10	令和 11	令和 12
		年度	年度	年度						
目標値	(単年度) 回数 (回)	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	(累計) 回数 (回)	1	2	3	4	5	6	8	10	12
実績	(単年度) 回数 (回) (累計) 回数 (回)									

(説明)

		調整・協議状況	事美	美性	
事業	事業者	(設立準備、一般送配電	コスト	事業採算性確保の見通し	課題
		事業者との連携協議等)		(金融機関協議状況等)	
		・再エネ協議会において			
PPA 事業・・・PPA の安定	地域新電力会社	これから検討予定。			
的、継続的実施					
		・梼原町所有の既存再エ			本町にある四国電力所有
再エネ発電事業・・・地域	梼原町	ネ発電、新設木質バイオ			の水力発電の再エネ電力
新電力への供給	地域新電力会社	マス発電からの供給を予			も供給を受けたいと思っ
が电力・の伝加	四国電力	定している。			ているが、卸価格の交渉
					がこれからの課題。
		・地域新電力会社を令和		・収支シミュレーション	既存の梼原産再エネ
小売電気事業	地域新電力会社	5年7月に設立する予		を行い事業採算性確保の	(FIT 電源)を特定卸供
(地域新電力)・・・余剰再		定で動いている。事業ラ		見通しをつけている。	給により買取ることを計
エネ電力の買取り、再工		イセンスを取得するのに			画しているため今後の電
ネメニュー		時間を要するので、小売			力市場の変動等注意が必
		り開始は5年度末を予			要。
		定			
		・令和5年度から受給			
アグリゲーター事業・・・	地域新電力会社	管理(エネルギーマネジ			
エネルギーマネジメント	(株)まち未来製作所	メント運営)の研修を受			
運営		け内製化に向けて取り組			
		んでいく。			

名称	取組内容(予定)	実施状況 (主な意見、懸念事項等)
梼原町まち・ひと・しご と創生総合戦略効果検証 委員会	町の関係各部署の他、住 民代表、産業関係者、学 識経験者、金融機関関係 者、行政関係機関 で組 織し、事業の効果検証を 行う。	令和4年11月開催の委員会において、進捗状況を報告済。 ・脱炭素先行地域に選ばれ、今後必要な事業であるため力を入れて進めてほしい。 ・大きな事業であるので、町民に中間報告等広報をすることで町民の理解も深まるのでは。(都度、タイミングのいい報告を心がけてほしい)という意見があり、広報誌などで計画の紹介を行った。
梼原町再生可能エネルギー推進協議会	町の関係各部署の他、住 民代表、町内電気事業 者、再生可能エネルギー 事業に関する見識を有す るもの及び企業、行政関 係機関で組織し、再エネ 事業実現に向けた方策の 検討・進捗管理を行 う。	令和4年度は、5回の協議会、2回の先進地視察を 行い、木質バイオマス熱電併給事業や地域新電力事 業について、意見を聞きながら事業を進めている。

- ・令和4年8月4日 四国経済産業局長と香川県善通寺市長が訪問し、脱炭素先行地域について意見交換を行った。
- ・令和 4 年 8 月 10 日 高知県三原村長と土佐清水市が訪問し、脱炭素先行地域について意見交換を行った。
- ・令和4年8月30日 環境省人材育成事業において、脱炭素先行地域の取組紹介を行った。
- ・令和4年9月10日 高知県の主催により、地球温暖化問題を考える「高知県脱炭素シンポジウム」において町長が本町の脱炭素先行地域の事業について取組紹介を行った。
- ・令和4年9月12日 新潟県関川村が訪問し、脱炭素先行地域について意見交換を行った。
- ・令和4年11月19日 梼原高校生、地域住民が参加し、本町と高知大学との共催でワークショップ「雲の上から未来の脱炭素を考える」を開催した。
- ・令和4年11月21日 愛媛県内子町が訪問し、脱炭素先行地域について意見交換を行った。
- ・令和 4 年 11 月 25 日 四国地域エネルギー・温暖化対策推進会議において脱炭素先行地域の取組紹介を行った。
- ・令和5年1月20日 環境省人材育成事業において、脱炭素先行地域の取組紹介を行った。
- ・令和5年2月8日 千葉県君津市及び君津市議会が訪問し、脱炭素先行地域について意見交換及び関連施設を視察した。
- ・令和5年3月18日 シンポジウム「持続可能な地域づくりは土佐の山間より」を開催し、本町の自然エネルギーの活用と地域経済との関係等の基調講演やパネルディスカッションを行った。
- ・その他、四国経済産業局、四国地方整備局等国の機関と脱炭素先行地域の取組紹介、現地視察、意見交換 を行った。

地方公共団体実行計画の策定又は改定状況

取組 内容	改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定状況等
事務事業編	□改定済(年 月) ■改定中(令和6年3月改定予定) □改定予定なし
区域施策編	(理由:)□策定・改定済(年 月)■策定・改定中(令和6年3月策定予定)□策定・改定予定なし(理由:)
促進区域 の設定	□設定済 (年 月) □検討中 (年 月設定予定) ■設定予定なし

(以下の項目については、計画対象年度に策定・改定した場合にのみ記載してください。)

計画期間:削減目標:取組概要:

対象	目標値
温室効果ガス総排出量	
太陽光発電設備を設置	
公共施設の省エネルギー対	
策の徹底	
公用車の電動車の導入	
LED 照明の導入	
再エネ電力調達の推進	

【区域施策編】

計画期間: 削減目標:

施策の実施に関する目標:

施策分類	目標・取組
再エネの導入促進	
事業者・住民の省エネそ	
の他の排出抑制促進	

別記様式第1号 別添	
【改正温対法に基づく促進区域の設定方針】	
